

NORMA LEGAL

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)

CONTENIDO	ARTICULO
"Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados". - "De legislación, normatividad y fiscalización";	Art. 29.- literal a)
"Al concejo municipal le corresponde". - "Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo al presente Código"	Art. 57.- literal m)
"Atribuciones de los concejales o concejales". - "Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y la ley"	Art. 58.- literal d)
Todas las correspondientes a su condición de concejal o concejala;	Art. 62 .- literal c)

PROCESO DE FISCALIZACIÓN

"Construcción de Bordillos, Adoquinado y Complementación de la red de Agua Potable y Alcantarillado de las Calles Laguna y Pajonal en El Barrio Donoso Cabezas de la Ciudad de Cayambe".

PROCESO	MCO-GADIPMC-19-2022
CONTRATISTA	Ing. José Luis Gaibor Nuñez
PRECIO DEL CONTRATO	USD 45.208,05 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin incluir el IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 días, desde el 23 de marzo del 2023, tiempo cumplido
DESCRIPCIÓN	Calles: Laguna y Pajonal ✓ Adoquinado y bordillos
BENEFICIARIOS	Contempla aproximadamente a 52.295,0 habitantes
OBSERVACIONES EN LA FISCALIZACIÓN	Con fecha 3 de octubre, visito la obra, mismo que se encuentran adoquines partidos, adoquines que se están separando uno de otro, en algunos lugares se encuentran levantados, bermas partidas, con estas anomalías sugiero que se notifique al contratista. 1.- Se haga las correcciones respectivas de los adoquines que están en mal estado 2.- Se haga un nuevo ensayo de resistencia a la compresión, de desgaste, y tracción indirecta de adoquines, por cuanto es una vía pública que transitan vehículos pesado y livianos. 3.- Que no se reciba la obra mientras no haya una corrección definitiva, el GADIP Municipio de Cayambe debe garantizar la entrega de la obra en buenas condiciones. 4.- Se remita a la vicealcaldía un informe técnico de fiscalización, de las notificaciones realizadas al contratista del estado en que se encuentra la obra y se adjunte los ensayos realizados.
CUMPLIMIENTO	Con Memorando Nro. GADIPMC-FIS-2023-0473-M, manifiesta que se realiza la notificación al contratista mediante Memorando

Nro. GADIPMC-FIS-2023-0472-M., la unidad de Fiscalización manifiesta que el contrato en mención se encuentra subsanada las observaciones.



CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PARA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LA REMONTA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE."

PROCESO	COTO-GADIPMC-03-2022 / 30/08/2022
CONTRATISTA	Ing. Armando Efrén Carvajal Ruiz
PRECIO DEL CONTRATO	USD. 925.046,01855 (NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS CON 01855/100) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin incluir IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	(90) días, contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible. / deposito 12 de septiembre 2022
CONTRATO COMPLEMENTARIO	COTO-GADIPMC-03-2022/ 14/08/2023
DESCRIPCIÓN	Tomar en consideración las Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios y Condiciones de Contratación establecidos, con el objeto de solventar los inconvenientes que permitan reestablecer en el menor tiempo posible el equilibrio económico, social y técnico dentro del proyecto.
PRECIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO	74.001,27 SETENTA Y CUATRO MIL UNO, 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin incluir IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 días, este se añadirá al plazo del contrato principal
BENEFICIARIOS	Población estimada es 85.795 habitantes
OBSERVACIONES	Se realizo el recorrido de obra, verificando su cumplimiento en sus tiempos de acuerdo al contrato firmado, al momento se encuentra terminado el 100%

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA”.

PROCESO	SIE-GADIPMC-107-2022
CONTRATISTA	Sra. Silvia Jeannette Solís Guevara
PRECIO DEL CONTRATO	USD 10.898,94 DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 94/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin incluir IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 días contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible. Anticipo 1 agosto 2023
MODALIDAD DE GESTIÓN	POR COGESTIÓN
NECESIDAD	Presenta fisuras en la estructura se tiene filtración, además, que la estructura no cumple de manera eficiente la función para la cual fue diseñada.
DESCRIPCIÓN	La Comuna Carrera dispone del sistema de agua de consumo humano desde el año 1988, uno de los problemas identificados en sitio es el mal estado de los tanques rompe presión, sistema de válvulas, ciertos tramos de tubería, por lo que es importante la adecuación y mantenimiento de los componentes del sistema de agua de consumo humano.
BENEFICIARIOS	Directos e indirectos 2084 habitantes
Observaciones	Ninguna
FISCALIZACIÓN	Se procedió a la visita in situ, conjuntamente con los técnicos de la Municipalidad, mismo que nos encontramos con el trabajo de mano de obra comunitaria.
ESTADO DE LA OBRA	Terminada



“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACABADOS EN EL CGI DE LA COMUNA SAN PEDRO, CERRAMIENTO DE LA UECIB MANUEL AGUILAR DE LA COMUNA SANTA ROSA DE PACCHA, BORDILLOS EN LA CALLE ROSA QUIMBILA DE LA COMUNIDAD LA JOSEFINA , POZOS DE ALCANTARILLADO PARA LA COMUNA JURÍDICA CHAMBITOLA DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA, MURO DE HORMIGON CICLÓPEO EN EL CGI DEL COMITÉ BARRIAL LA BUENA ESPERANZA, CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL Y CGI DEL COMITE DE DESARROLLO COMUNAL SAN FRANCISCO DE LA COMPAÑÍA, BORDILLOS EN LA

CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO CASHAPAMBA Y ALCANTARILLA DE LA COMUNA SANTO DOMINGO No. 2 DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE AYORA, MURO Y ACERAS EN EL ESTADIO DEL COMITE PRO MEJORAS DEL BARRIO SAN NICOLAS DE CAYAMBE; READECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL CGI DEL COMITE PRO MEJORAS DEL BARRIO SANTA LAURA DE CHANGALA DE CAYAMBE; AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL COMITE PROGRESO DEL BARRIO CENTRAL DE LA PARROQUIA DE JUAN MONTALVO; REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA DE LA ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI Y MANTENIMIENTO DE OBRAS MENORES DENTRO DEL CANTON.”

CONTRATO DE “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA UECIB MANUEL AGUILAR DE LA COMUNA SANTA ROSA DE PACCHA

PROCESO	PROCESO No. SIE-GADIPMC-22-2023.
CONTRATISTA	Jerez Custode Marcelo Alejandro
PRECIO DEL CONTRATO	216.437,64624 (doscientos dieciseis mil cuatrocientos treinta y siete con 64624/100 dólares americanos) valor que incluye IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	45 días contados desde la fecha de suscripción del contrato.
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión
BENEFICIARIOS	Aproximadamente a 116.039 habitantes
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA	Realizada la verificación de la obra, se informa a la máxima autoridad que existe faltante de cemento para culminar en su totalidad, al parecer en el proyecto no se contempló la cantidad exacta del cemento y arena, por lo que el señor director de la Institución, estima como faltante 200 quintales. De igual forma, se constata que para construir el cerramiento en la parte ESTE de la institución se necesita desalojar tierra, por lo que es necesario contribuir con la maquinaria como excavadora y volqueta de la Municipalidad. Con lo manifestado, solicito señor alcalde, de la manera más urgente se atienda con el material faltante, así como también se programe para el apoyo con la maquinaria.
RESPUESTA	El director de Obras Publicas manifiesta que se están ejecutando todas las acciones necesarias para alcanzar el objeto de la contratación y así satisfacer esta importante necesidad.



“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN INTERCULTURAL DE LA COMUNA LA LIBERTAD DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA”

PROCESO	PROCESO No. SIE-GADIPMC-12-2023
CONTRATISTA	Silvia Jeannette Solís Guevara
PRECIO DEL CONTRATO	USD 38.573,05 (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 05/100) sin incluir IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 días contados desde la fecha de notificación que el anticipo
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión
BENEFICIARIOS	Población beneficiada directamente los habitantes de la Comuna la Libertad, y Beneficiará al cantón Cayambe cuya población estimada es 85.795 habitantes.
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA	<p>De conformidad al contrato: Adquisición de materiales para la construcción del Centro de Gestión Intercultural de la comuna la Libertad de la Parroquia de Cangahua, se realice la visita respectiva para la constatación de la construcción del CGI, en la cual el señor Presidente de la Comunidad y demás dirigentes, realizan algunas observaciones encontradas.</p> <p>1.- Dentro de la entrega de materiales no contempla la entrega de bloques, al ser unos de los principales materiales para la construcción requieren de la manera urgente se haga la entrega de dichos bloques; según manifiesta el señor presidente de la Comunidad que el señor Alcalde les pidió que en 3 meses se debe terminar la construcción, por tanto es la preocupación de la comunidad.</p> <p>2.- En el proyecto para la construcción del CGI, no se contempló la cantidad exacta de ripio y arena, por lo que el señor presidente de la comunidad, estima como faltante una volqueta de cada material pétreo.</p> <p>Con lo manifestado, solicito lo más urgente se atienda con el material faltante, a fin de que se pueda culminar con la obra.</p> <p>3.- Cabe manifestar también, que se haga un llamado al director departamental y personal técnico que realizan los proyectos, a fin de que sean más minuciosos en los cálculos de materiales, para no tener inconvenientes ni malestares de la ciudadanía.</p>



“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA UNIDAD EDUCATIVA ISLA SANTA MARIA DE LA COMUNIDAD LA CANDELARIA DE LA PARROQUIA CANGAHUA.”.

PROCESO	PROCESO No. SIE-GADIPMC-109-2022
CONTRATISTA	señora Silvia Jeannette Solís Guevara
PRECIO DEL CONTRATO	USD 14,600.00 CATORCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin incluir IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 días contados desde la fecha de notificación que el anticipo
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por cogestión
BENEFICIARIOS	Directos: Habitantes del barrio Central de la parroquia. Indirectos: Beneficiará al cantón Cayambe cuya población estimada es 85.795 habitantes.
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA	<p>De conformidad al contrato: Adquisición de materiales para la construcción de un aula en la Unidad Educativa Isla Santa María de la comunidad de Candelaria de la Parroquia Cangahua, proceso No. SIE-GADIPMC-109-2022; con fecha 17 de octubre del 2023, realice la visita a la Unidad Educativa Isla Santa María, mismo que al momento se hallan en los trabajos de construcción del aula con mano de obra de los padres de Familia, y se constata las siguientes observaciones.</p> <p>1.- En el proyecto para la construcción del aula, no se contempló la cantidad de tablas que se necesita para las vigas colgantes. 2.- De igual forma hay faltante de ripio y polvo de piedra para la loza.</p> <p>De igual forma, solicitan la presencia de un técnico para el asesoramiento, si estructuralmente es dable la construcción de un tercer piso con estructura metálica, mismo que a futuro aspiran construir.</p> <p>Con lo manifestado, solicito señor Alcalde, de la manera más urgente se atienda con el material faltante, a fin de que se pueda culminar con la obra, al momento existe la plena colaboración y predisposición de los padres de familia que contribuyen con su mano de obra, para la comodidad de sus hijos que asisten día a día a sus clases.</p> <p>Cabe manifestar también, que se haga un llamado al director departamental y personal técnico que realizan los estudios, a fin de que sean más minuciosos en los cálculos estructurales, para no tener inconvenientes ni malestares de la ciudadanía.</p>



BARRIO ISHIGTO

CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS Y BORDILLOS DE VARIAS VÍAS DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO."

PROCESO	Proceso N°: SIE-GADIPMC-46-2022
CONTRATISTA	Ing. Chicaiza Granda Edgar Iván
PRECIO DEL CONTRATO	USD 63.642,35 (SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 35/100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin incluir el IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 (treinta) días contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por cogestión
BENEFICIARIOS	Directos: 690 habitantes directos del barrio Los Granados, Huertos Familiares e Ishigto. Indirectos: Beneficiará al cantón Cayambe cuya población estimada es 85.795 habitantes.
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA	Luego de la verificación de la obra de solicito al señor Alcalde se corrija lo siguiente. a) Falta la instalación de una tapa de sumidero para desagües, de acuerdo a manifestaciones de los dirigentes, le corresponde a la junta de agua de riego del canal Ishigto, se solicitó que el barrio se haga responsable y se comunique a los dirigentes para que realicen este trabajo. b) Existe un tramo de adoquines levantados de aproximadamente 100m ² de la vía recién adoquinada ocasionado por la rotura de tubería de desagüe del tanque de agua potable que abastece al barrio Primero de Mayo del Centro Poblado de Juan Montalvo, en la cual la compostura la debe realizar la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo de la Parroquia Juan Montalvo, tal como se le indico a un representante de la misma y en la que manifiesta que en el transcurso de la semana del 20 de noviembre del 2023 inician los trabajos de arreglo. REQUERIMIENTO A LOS DIRIGENTES DEL BARRIO a) Se solicito a los dirigentes del barrio que oficialicen a los frentistas para que mantengan limpia su vereda, sin hierbas. b) Se solicitó a los dirigentes del barrio, que mediante mingas realicen la limpieza de la vía, el retiro de materiales pétreos sobrantes y adoquines rotos.
RESPUESTA	Desde la fecha de fenecimiento del plazo contractual hasta la fecha de entrega de materiales de 25 de julio de 2023, el contratista tiene un total de 144 días de mora. El valor de la multa por mora, conforme la Cláusula Novena del contrato y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública vigente, es de 3844.84 USD, correspondiente al 6.04 % del monto contractual.



“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO EN EL COMITÉ PRO MEJORAS CONVALECENCIA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO.”

PROCESO	PROCESO No. SIE-GADIPMC-52-2022
CONTRATISTA	Ing. Chicaiza Granda Edgar Iván
PRECIO DEL CONTRATO	USD 125.105,40 (CIENTO VEINTE Y CINCO MIL CIENTO CINCO CON 40/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 (sesenta) días contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por cogestión
BENEFICIARIOS	Directos: 236 habitantes del comité Pro Mejoras Convalecencia. Indirectos: Beneficiará al cantón Cayambe cuya población estimada es 85.795 habitantes.
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA	Luego de la verificación de la obra conjuntamente con los dirigentes de la comunidad y técnicos del GADIPMC, se realiza observaciones al señor Alcalde. a) Se constata que existe adoquines desportillados b) Se procedió a medir los adoquines, mismos que presentan las siguientes dimensiones del adoquín hexagonal 23,7 cm. x 21,9 cm., igual varían las dimensiones. c) Revisado las especificaciones técnicas manifiesta textualmente: La forma y dimensiones de los mismos están indicados en los planos correspondientes y sus medidas serán verificadas por Fiscalización. El espesor del adoquín será de 8cm. Las dimensiones del adoquín hexagonal serán de 22,0cm x 24,0 cm. Los adoquines presentarán alta regularidad de sus formas, caras perfectamente escuadradas y paralelas, textura fina y algo rugosa en todas sus caras. Con lo descrito, al parecer no cumplen con las especificaciones técnicas descritas, razón por la cual se estimaría un faltante en el área total de adoquinado.

d) Solicito, el informe técnico de los ensayos realizados a los adoquines, así como el informe de la forma y dimensiones de los adoquines que se encuentran en el lugar.

Para comprobar los análisis respectivos, realizó la toma de 10 unidades de adoquines y de manera personal se envía a un laboratorio certificado para la constatación si el material que entregan es aceptable.

De acuerdo al reporte recibido del laboratorio en las Caracterización de agregados, Compresión de Adoquines, Resistencia al desgaste por abrasión, no en encuentra novedad en los informes de ensayo.

EMELNORTE

Solicito una inspección urgente para el retiro de los postes de energía eléctrica que están dentro de la vía, para continuar con los trabajos de adoquinado, de igual forma nos ayude con el informe técnico y de presupuesto.

Con fecha 23 de agosto del 2023, los dirigentes de la comunidad Convalecencia ya se acercaron a solicitar dicha inspección, mismo que hasta la fecha no tenemos respuesta, por tal motivo me veo obligada a hacer nuevamente la solicitud.

RESPUESTA

Continuar con la entrega de los materiales contratados a la brevedad posible, los cuales deben cumplir con la cantidad y especificaciones técnicas establecidas.

Realizar de manera periódica la constatación de los materiales entregados con la Jefatura de Bienes y Servicios.



CONTRATO PARA: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CGI EL VERDE DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO."


PROCESO	PROCESO N° SIE GADIPMC-105-2021
CONTRATISTA	Ing. Freddy Daniel Loachamin Chano
PRECIO DEL CONTRATO	USD 35.021,99 TREINTA Y CINCO MIL VEINTE Y UNO CON 99/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin incluir el IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	(30) días contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión
BENEFICIARIOS	Directos: 151 habitantes de la Asociación de Trabajadores Autónomos "El Verde" Indirectos: Beneficiará al cantón Cayambe cuya población estimada es 85.795 habitantes.
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA	Conjuntamente con el dirigente de la comunidad, personal técnico de la Dirección de Obras Públicas, se constata la obra de construcción del Centro de Gestión Intercultural de la comunidad el Verde del periodo anterior, para lo cual debo manifestar que la obra al momento se encuentra paralizada por falta de colaboración de la mano de obra de la comunidad. Se recomienda al dirigente que retome los trabajos y culmine en el menor tiempo posible.
ESTADO	Al momento se encuentra en un 70 % de trabajos ejecutados



HATO SAN JOSE

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE GESTIÓN INTERCULTURAL EN LA CORPORACIÓN EL HATO, DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO.

PROCESO	Proceso: SIE-GADIPMC-49-2021
CONTRATISTA	JUAN ANTONIO SEGOVIA CRUZ,
PRECIO DEL CONTRATO	USD 23.486,60 (VEINTE Y TRES MIL CUATRO CIENTOS CHENTA Y SEIS CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 días contados desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión
BENEFICIARIOS	Directos: Comuna “Espiga de Oro” y el comité pro mejoras “Hato Pucara” Indirectos: Beneficiará al cantón Cayambe cuya población estimada es 85.795 habitantes.
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA	Se realiza el recorrido de la obra conjuntamente con los dirigentes de la comunidad, técnica de la Dirección de Obras Públicas, a fin de constatar el estado en que se encuentra el mejoramiento del Centro de Gestión Intercultural, se verifica sin culminar por falta de colaboración de mano de obra de los comuneros. Se constató como faltante la fabricación de una ventana pequeñas en el CGI, para lo cual, se recomienda a los dirigentes de la Comunidad lo adquieran con fondos propios, por cuanto de acuerdo al convenio firmado en la administración anterior, esta cumplido la entrega de materiales al 100%.
ESTADO	Con las recomendaciones establecidas se retomó los trabajos al momento de encuentra culminado al 100%

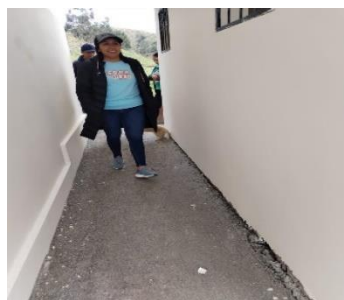

HATO SAN JOSÉ

**CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN EL CGI DEL COMITÉ DE DESARROLLO
COMUNITARIO HATO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO**

PROCESO	Proceso: SIE-GADIPMC-49-2021
CONTRATISTA	JUAN ANTONIO SEGOVIA CRUZ
PRECIO DEL CONTRATO	USD 23.486,60 (VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 días contados desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión
BENEFICIARIOS	Directos: Comuna "Hato San José". Indirectos: Beneficiará al cantón Cayambe cuya población estimada es 85.795 habitantes.
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA	Se realiza el recorrido de la obra conjuntamente con los dirigentes de la comunidad, técnica de la Dirección de Obras Públicas, a fin de constatar el estado en que se encuentra la construcción de las baterías sanitarias, para lo cual los materiales que constan dentro del contrato la comunidad han recibido sin ningún inconveniente y de acuerdo a lo que establece el contrato de Adquisición de materiales. Se constató como faltante la fabricación de dos ventanas pequeñas en la construcción de las baterías sanitarias, sin embargo, se recomienda que se culmine con fondos propios por cuanto es contrato de la administración anterior, y lo que queremos es ver culminada la obra y sea cumplido con el objetivo del proyecto, de igual se recomienda a los dirigentes de la Comunidad que de acuerdo al convenio firmado con la Municipalidad se culmine la obra.
ESTADO	Con la recomendación realizada, al momento se ha culminado la obra.



HATO SAN JOSÉ

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL HATO SAN JOSÉ, DE LA PARROQUIA DE JUAN MONTALVO.”

PROCESO	PROCESO No. SIE-GADIPMC-13-2023	
CONTRATISTA	Ing. Manuel Aurelio Salgado Méndez	
PRECIO DEL CONTRATO	USD 5.588,78 (CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 días contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.	
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión	
BENEFICIARIOS	Directos: Comuna “Hato San José”. Indirectos: Beneficiará al cantón Cayambe cuya población estimada es 85.795 habitantes.	
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA	Se realiza el recorrido de la obra de adoquinado y bordillos conjuntamente con los dirigentes de la comunidad, técnica de la Dirección de Obras Públicas, a fin de constatar el estado en que se encuentra la obra, para lo cual los materiales que constan dentro del contrato la comunidad han recibido en los tiempos establecidos en el Contrato, de igual forma las cantidades establecidos en el contrato, los trabajos con la mano de obra comunitaria se encuentran culminado de acuerdo al área calculado.	
ESTADO	TERMINADO	



“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN CAYAMBE NORTE.”

ADOQUINADO JESUS DE NAZARET (L=126m ; 7,20m; L=28m; a=7m; L=13m , a=3,80m)

PROCESO	PROCESO No. SIE-GADIPMC-16-2023
CONTRATISTA	Carlos Marcelo Escobar Morocho
PRECIO DEL CONTRATO	USD 18.073,31680 valor establecido en el proyecto
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 días contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión
BENEFICIARIOS	Directos: Aproximadamente a 68.747 habitantes Indirecto: Beneficiará al cantón Cayambe cuya población estimada es 85.795 habitantes.
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA	Luego de la visita a la obra conjuntamente con técnicos del GADIPM, y dirigentes del barrio, se realiza recomendaciones. a) Los adoquines presentan pocas rebabas, sus dimensiones de acuerdo a las especificaciones técnicas, no hay inconvenientes para la colocación de los adoquines. b) La entrega de cemento se realizará de acuerdo como vayan culminando, bajo la coordinación de la Dirección de Obras Públicas del GADIPMC y los dirigentes del barrio. c) Revisado los informes de los ensayos realizados, se verifica dentro de los parámetros que contemplan en los TDR.
ESTADO	Terminado



“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS PARA LA VÍA DE ACCESO A MONJAS, DE LA PARROQUIA DE JUAN MONTALVO.”

PROCESO	PROCESO No. SIE-GADIPMC-03-2023
CONTRATISTA	Sra. Johanna Tatiana Asimbaya Nasimba
PRECIO DEL CONTRATO	20,490.00 Veinte Mil Cuatrocientos Noventa con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 días contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión
BENEFICIARIOS	Directos: aproximadamente a 1127 habitantes Indirectos: Beneficiará al cantón Cayambe cuya población estimada es 85.795 habitantes.
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA	<p>Conjuntamente con la técnica de la Dirección de Obras Públicas, y dirigentes de la comunidad Santa Isabel de la Parroquia de Juan Montalvo, se recorre la obra y se verifica la construcción de bordillos que se encuentra terminado y en espera de los resultados a los ensayos de los adoquines, enviados por parte de la Unidad Fiscalización del GADIPMC, para que se dé el inicio de obra por la comunidad.</p> <p>OBSERVACIONES ENCONTRADAS</p> <p>a) Se constata el adoquín de color verde y amarillo son pálidos, revisado las especificaciones técnicas manifiesta textualmente: <i>El adoquín verde y amarillo deberá tener un color uniforme en todo su elemento.</i></p> <p>b) La Directiva de la Comunidad Santa Isabel solicitan la maquinaria pertinente para la reubicación del material pétreo de la vía.</p> <p>REQUERIMIENTO</p> <p>1.- Solicito, el informe técnico de los ensayos realizados a los adoquines, así como el informe de la forma y dimensiones de los adoquines que se encuentran en el lugar.</p> <p>2.- Solicito, una copia certificada del documento donde acuerdan el cambio del lugar de la construcción de la obra, (bordillos y adoquinado) de las vías de acceso a Monjas a la Comunidad Santa Isabel.</p>
ESTADO	Obra en construcción



**CONSTRUCCION DEL ASFALTADO DE LA VIA AL
NEVADO CAYAMBE QUINTA ETAPA.**

PROCESO	RE-GADIPMC-07-2022
CONTRATISTA	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL E.P.
PRECIO DEL CONTRATO	\$ 817.307,58
PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días (desde la notificación que el anticipo se encuentra disponible)
MODALIDAD DE GESTIÓN	CONTRATO
BENEFICIARIOS	Habitantes de las comunidades aledañas de todas las del cantón Cayambe. Así como turistas que visitan el Nevado Cayambe con una cifra aproximadamente de 33.000 vehículos al año.
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA	Se recorrió con los técnicos del GADIPMC, se verifica el avance de la obra, el plazo de entrega tiene un retraso den los tiempos de entrega de la obra de acuerdo al contrato razón por la cual se solicita a la Unidad de Fiscalización, proceda con los informes respectivos.
ESTADO	Obra terminada, en proceso de informes de fiscalización, para la liquidación.



CONTRATO: “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE VIAS PRINCIPALES DE LA COMUNA CARIACU, PARROQUIA SAN JOSE DE AYORA, SEGUNDA FASE.”

PROCESO	PROCESO No. SIE-GADIPMC-15-2023
CONTRATISTA	Sr. Manuel Aurelio Salgado Méndez
PRECIO DEL CONTRATO	USD 244.682,54 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 54/100) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	45 días contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA	<p>Conjuntamente con la técnica de la Dirección de Obras Públicas, dirigentes de la comunidad de Cariacu, maestro de obra, se verifica la obra de adoquinado en construcción con la mano de obra comunitaria, así como el adecentamiento de la vía con la maquinaria de la Municipalidad, para posterior iniciar con los trabajos de adoquinado, también informo que en el recorrido manifiesta el malestar de los dirigentes con respecto a las especificaciones técnicas de los adoquines para lo cual me permito detallar.</p> <p>1.- En el momento se cogió de forma aleatoria 2 adoquines para la verificación de sus dimensiones, puesto que muestran lo siguiente 21.9cm. x 23.7cm. en lugar de 22cm. X 24cm., 21.8cm x 23.8cm, en lugar de 22cm x 24cm, puesto que se revisó las especificaciones técnicas de los adoquines para la comunidad de Cariacu y constan de 22cmx24cm. Con lo manifestado y a mi criterio preexistiría faltante en el área de adoquinado, de acuerdo a la verificación de las dimensiones del adoquín antes mencionado.</p> <p>PEDIDO DE LA COMUNIDAD</p> <p>1.- Por parte del presidente de la Comunidad requieren el apoyo con la maquinaria por dos días más, de la fecha que finaliza, por cuanto no han culminado con los trabajos programados, señor Alcalde recomiendo de ser factible se apoye con el pedido.</p> <p>2.- El presidente de la Comunidad solicita que la Unidad de Fiscalización emita los informes pertinentes que garantice que en el momento de recibir el material cumplan con las especificaciones establecidas en el contrato.</p> <p>Con lo manifestado se solicita:</p> <p>1.- Informes de fiscalización del material recibido, así como los ensayos realizados.</p> <p>2.- Ensayos de resistencia de suelo.</p>
ESTADO	Con todas las correcciones realizadas, al momento la obra se encuentra terminado



ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CGI DE LA COMUNIDAD SAN PABLO URCO DE LA PARROQUIA OLMEDO

PROCESO	SIE-GADIPMC-48-2022
CONTRATISTA	SILVIA JEANNETTE SOLIS GUEVARA
PRECIO DEL CONTRATO	USD 68.700,00 (Sesenta y ocho mil setecientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 días contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN	<p>Conjuntamente con los dirigentes de la comunidad, maestro de obra, técnica de la Dirección de Obras Públicas, se realizó la constatación de la construcción de camerino, para lo cual detallo lo siguiente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se verifica el trabajo positivo de la comunidad, con la mano de obra comunitaria, en el amarre de las varillas en la loza. 2.- Se comunico que la entrega del cemento se lo realizará de acuerdo al avance de la obra 3.- De acuerdo a versiones del maestro de obra el día sábado 25 de noviembre se realiza la fundición de la loza, con minga comunitaria. <p>RECOMENDACIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Recomiendo que la Dirección de Participación Ciudadana a través de sus promotores, se dé el seguimiento respectivo 2.- Recomiendo la visita de un técnico antes de la fundición de la loza, a fin de que apoye con la asistencia técnica.

ESTADO

Terminado



unidos renacemos / ayllukunawan wiñarinchik

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS DE LA ASOCIACIÓN AGRICOLA Y GANADERA SUMAK WAKRA, DE LA COMUNIDAD INDÍGENA PUKARA DE PESILLO”.

PROCESO	SIE-GADIPMC-74-2022
CONTRATISTA	Sra. Paulina Margarita Fernández Nasimba
PRECIO DEL CONTRATO	USD 44.309,57 CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin incluir IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 días contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión
BENEFICIARIOS	Directos: 288 habitantes (de acuerdo al censo facilitado por la comunidad indígena Pukara de Pesillo. Indirectos: Visitantes y los usuarios de los sectores aledaños que se integren a futuro, puesto que harán uso de la obra.
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN	Se realiza la visita y constatación de la construcción de la planta Procesadora de lácteos de la Asociación Agrícola y Ganadera Sumak Wakra, conjuntamente con los dirigentes de la comunidad, maestro de obra, técnica de la Dirección de Obras Públicas, de las cuales se pudo observar lo siguiente: 1.- Se verifica el trabajo activo, con la mano de obra de la Asociación, sin embargo, el maestro de obra y los dirigentes, manifiesta que han tenido faltantes de materiales pétreos, bloques, alambres de luz, y tubería para agua potable; por lo que se manifestó que existe un convenio firmado entre las partes a fin de que puedan solventar los faltantes. 2.- Solicitan el cambio del lugar para la construcción del cuarto de máquinas, a fin de neutralizar los olores del combustible a la sala de insumos y producción, mismo que la comunidad está en capacidad de construir. 3.- Informan que no colocarán la cerámica del piso para la sala de producción entregada por la Municipalidad, por las observaciones realizadas por los entes de control, sin embargo, la Asociación asumirá los costos para el cambio de material de acuerdo a las recomendaciones que realicen. RECOMENDACIÓN 1.- Recomiendo que conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas, y Procurador Sindico analicen y se dé una vialidad al punto dos, a fin de que al finalizar la construcción del proyecto se pueda cerrar sin ningún inconveniente. 2.- Por pedido de las comunidades recomiendo se socialice los proyectos a construir, aclarando que de acuerdo a los estudios realizados el presupuesto asignado por la Municipalidad no va alcanzar a culminar la obra en su totalidad, a fin de que la comunidad puede confirmar su capacidad económica para terminar el proyecto, ya que han tenido muchas falencias en los

ESTADO

cálculos y muchas de las obras han quedado por años inconclusos.

Terminado



CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMERINO EN EL ESTADIO DEL CENTRO CIVICO DE LA COMUNA DE SAN PABLO URCO, PATIO EN LA UNIDAD EDUCATIVA "LUIS NAPOLEÓN DILLON", ADOQUINADO EN LA CALLE S/N EN EL BARRIO LA MERCED, CERRAMIENTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL CANTÓN CAYAMBE; READECUACIÓN DE LA PLANTA ALTA DE LA CASA COMUNAL DE LA CHIMBA, CASA BARRIAL PUNTIACHIL, CUBIERTA DE LA ESCUELA "CAPITÁN JULIÁN QUITO", ESPACIOS COMUNITARIOS DE LA PARROQUIA CANGAHUA Y ÁREAS RECREATIVAS DEL BARRIO MARIANA DE JESÚS"

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMERINO EN EL ESTADIO DEL CENTRO CIVICO DE LA COMUNA DE SAN PABLO URCO.

PROCESO	PROCESO No. SIE-GADIPMC-104-2021
CONTRATISTA	Ing. Edgar Iván Chicaiza Granda
PRECIO DEL CONTRATO	USD 90.300,00 (noventa mil trescientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA:
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 días, contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión
BENEFICIARIOS	La población beneficiada del proyecto contempla aproximadamente a 109.652* dividida en 53.729 hombres y 55.923 mujeres, tomando en cuenta una proyección al año 2021 del Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en el 2010.
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN	<p>Conjuntamente con los dirigentes de la comunidad, maestro de obra, técnica de la Dirección de Obras Públicas, se realizó la constatación de la construcción de camerino, para lo cual detallo lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se verifica el trabajo positivo de la comunidad, con la mano de obra comunitaria, en el amarre de las varillas en la loza. 2.- Se comunico que la entrega del cemento se lo realizará de acuerdo al avance de la obra 3.- De acuerdo a versiones del maestro de obra el día sábado 25 de noviembre se realiza la fundición de la loza, con minga comunitaria. <p>RECOMENDACIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Recomiendo que la Dirección de Participación Ciudadana a través de sus promotores, se dé el seguimiento respectivo 2.- Recomiendo la visita de un técnico antes de la fundición de la loza, a fin de que apoye con la asistencia técnica.
ESTADO	Obra en ejecución con un avance del 80%



SANTA ROSA DE LA COMPAÑÍA

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN CAYAMBE NORTE.”

PROCESO	SIE-GADIPMC-16-2023
CONTRATISTA	Sr. Carlos Marcelo Escobar Morocho
PRECIO DEL CONTRATO	USD 169,396.25 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 25/100) DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin incluir el IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 días contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN	En compañía de los dirigentes de la comunidad, técnica de la Dirección de Obras Públicas, se procedió con la constatación de la obra de adoquinado, mismo que se encuentra concluido, por decisión de la directiva de la Comunidad, revisado el proceso de contratación se verifica que se ha entregado los materiales en los tiempos establecidos en el contrato.
ESTADO	Terminado



“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN CAYAMBE NORTE.”

VÍAS ACCESO A PULIZA

PROCESO	SIE-GADIPMC-16-2023
CONTRATISTA	señor Carlos Marcelo Escobar Morocho
PRECIO DEL CONTRATO	USD 169,396.25 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 25/100) DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin incluir el IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 días contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión
BENEFICIARIOS	Directos: 2114 habitantes Indirectos: Comunidades aledañas
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN	Se recorre la construcción del adoquinado de la vía de acceso a Puliza y Turucucho, conjuntamente con la técnica de la Dirección de Obras Públicas, mismo que se encuentra en construcción.
ESTADO ACTUAL	Terminado



TURUCUCHO

CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN CAYAMBE NORTE"

PROCESO	SIE-GADIPMC-16-2023
CONTRATISTA	Sr. Carlos Marcelo Escobar Morocho
PRECIO DEL CONTRATO	USD 169,396.25 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 25/100) DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin incluir el IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 días contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión
BENEFICIARIOS	Directos: habitantes de los sectores de La Chimba, Turucucho, Santa Ana, Puliza Indirectos: Comunidades pertenecientes a la parroquia Olmedo que se encuentran aledaños a las zonas del proyecto. Cabe mencionar que a nivel general los proyectos de vialidad benefician a toda la población del cantón Cayambe.
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN	Se recorre la construcción del adoquinado de la vía de acceso a Turucucho, conjuntamente con la técnica de la Dirección de Obras Públicas, mismas que se encuentra avanzando con la obra, con la participación de la mano de obra de los miembros de la comunidad.
ESTADO ACTUAL	Terminado



VÍA AL PUENTE VIEJO (LA CHIMBA)

CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN CAYAMBE NORTE."

PROCESO	SIE-GADIPMC-16-2023
CONTRATISTA	Sr. Carlos Marcelo Escobar Morocho
PRECIO DEL CONTRATO	USD 169,396.25 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 25/100) DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin incluir el IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 días contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por Cogestión
BENEFICIARIOS	Directos: Comunidad la Chimba Indirectos: Comunidades aledañas y el comercio del cantón.
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN	Se recorre la obra conjuntamente con un técnico de la Dirección de Obras Públicas, mediante el Convenio de transferencia de recursos para el pago de la mano de obra de adoquinado y empedrado en la parroquia de Olmedo, se encuentran ejecutando la construcción de los bordillos, en coordinación del GAD Parroquial de Olmedo.
ESTADO	En construcción



“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ALCANTARILLA DE LA COMUNA SANTO DOMINGO NO. 2

PROCESO	SIE-GADIPMC-22-2023
CONTRATISTA	Jerez Custo de Marcelo Alejandro
PRECIO DEL CONTRATO	USD 114.580,00 (Ciento catorce mil quinientos ochenta con 00/100 dólares) sin incluir IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	45 días contados desde la fecha de suscripción del contrato.
MODALIDAD DE GESTIÓN	Por cogestión
BENEFICIARIOS	Comunidad Santa Domingo 2, y comunas y barrios aledaños de la Parroquia San José de Ayora.
OBSERVACIONES A LA FISCALIZACIÓN	Construcción de alcantarilla y Bordillos en la Calle Principal el Barrio Cashapamba de la comunidad Santo Domingo 2, conjuntamente con los técnicos del GADIPMC, y dirigentes de la Comunidad se realiza el recorrido de la obra, realizado con la mano de obra comunitaria, revisado todo el proceso la entrega de materiales se realiza en el tiempo establecido en el contrato, al momento se está trabajando en el adacentamiento de la vía.
ESTADO	Terminado

unidosrenacemos / ayllukunawanwiñarinchik



FISCALIZACION DOCUMENTADA

DOCUMENTO	DESTINATARIO	PEDIDO	RESULTADOS
Memorando Nro. GADIPMC-VAL-2023-0264-M	DIRECTORA FINANCIERA (E)	De acuerdo revisión parcial del contrato colectivo indefinido vigente celebrado entre el GADIPMC y el Comité Central Único de los Trabajadores del GADIPMC, SOLICITO se remita un informe financiero concerniente a los Art. 17, 27 y 33, del documento en mención.	Manifiesta que no se encuentran incluidos estos rubros, por cuanto estos beneficios han sido creados sin tomar en cuenta el Decreto Ejecutivo 1701 publicado en el Registro Oficial 592 del 18 de Mayo del 2009.
Memorando Nro. GADIPMC-VAL-2023-0274-M	ALCALDE	Solicito la nómina de trabajadores que pertenecen al Código de Trabajo que se encuentren desempeñando sus actividades administrativas en las oficinas. De igual forma solicito también bajo que normativa legal o parámetros pasaron a desempeñar sus funciones administrativas en las oficinas.	Manifiesta que el Ministerio del Trabajo expide los techos de negociación para la suscripción de contratos colectivos de trabajo, contratos individuales de trabajo y actas transaccionales y el cuadro de actividades de las denominaciones de puesto de techos de negociación para la suscripción de contratos colectivos de trabajo, contratos individuales de trabajo y actas transaccionales de trabajo.
Memorando Nro. GADIPMC-VAL-2023-0185-M	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Solicito el contrato principal y complementario de la vía al nevado	Entrega toda la información, se ha revisado los procesos encontrando con novedades del incumplimiento en los plazos de entrega establecidos en los contratos, mismo que esta se generan informes de fiscalización, a fin de determinar multas.
GADIPMC-VAL-2023-0281-M	DIRECTOR DE TURISMO,	Solicito, me proporcione la copia del contrato de arrendamiento del Complejo Turístico Piscinas Ishigto,	Entrega la información, en la cual se verifica el incumplimiento del contrato de arriendo, al

	CULTURA Y PATRIMONIO	así como el informe de cumplimiento de acuerdo a lo que establece dicho contrato.	momento se encuentra en proceso de terminación del contrato.
GADIPMC-VAL-2023-0187-M	DIRECTOR DE TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO	Solicito emita el informe técnico de cumplimiento de la constatación física de los implementos deportivos entregados por el GADIPMC a la Liga Deportiva Cantonal de Pichincha.	Con Memorando Nro. GADIPMC-VAL-2023-0272-M, se insiste con la información.
GADIPMC-VAL-2023-0202-M	DIRECTOR DE TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO	Solicito la siguiente información: 1. Convenios originales firmados para el uso del estadio estadio Guillermo Albornoz, con las instituciones solicitantes. 2. Informe sobre el cumplimiento de los convenios en tiempos y su uso.	Entrega la información requerida, se verifica aproximadamente en un 95% de cumplimiento a las cartas de intención firmados con instituciones, organizaciones y personas naturales para el uso del Estadio Guillermo Albornoz.
GADIPMC-VAL-2023-0188-M	ALCALDE	Solicito la siguiente información: 1.- Listado de auspiciantes a las fiestas de San Pedro y del Sol den la Mitad del Mundo 2023. 2.- Copias de los convenios firmado con los auspiciantes 3.- Informe del cumplimiento de cada uno de los convenios	Entrega la información, se verifica el cumplimiento de los auspiciantes de las fiestas.
GADIPMC-VAL-2023-0189-M	ALCALDE	Solicito se emita un informe técnico del estado físico en que se encuentra el estadio Guillermo Albornoz, áreas verdes, graderíos, infraestructura en general.	La Jefatura de Patrimonio, Intercultural, Deportes y Recreación no cuenta con técnicos para emitir dicho informe de infraestructura. Por lo que solicito al Alcalde que a través de un técnico de Obras Públicas lo realice.
Oficio Nro. GADIPMC-VAL-2023-0034-O	EMAPAAC	Solicito la siguiente información 1.- Manual de descripción y perfil del puesto 2.- Estatuto Orgánico Institucional 3.- Certificación presupuestaria para solventar el pago para la contratación de las vacantes existentes.	Se revisa toda la información con el apoyo técnico financiero.

		<p>4.- Distributivo sueldos de los años 2022 y 2023</p> <p>5.- Liquidación presupuestaria de la Institución al 31 de mayo del 2023.</p> <p>Además, solicito me otorgue la siguiente información:</p> <p>1.- Listado de funcionarios, con nombramiento, contrato y código de trabajo a la fecha.</p> <p>2.- Copias del proceso del concurso de mérito y oposición del año 2022.</p> <p>3.- Listado de funcionarios, con nombramiento, contrato y código de trabajo del año 2022.</p>	
GADIPMC-VAL-2023-0043-0	EMAPAAC	<p>Solicito la siguiente información:</p> <p>1.- Estados financieros con corte al 31 de agosto del 2023, con sus respectivos justificativos y anexos.</p> <p>2.- Comprobantes de ajustes al 31 de agosto del 2023, con sus respectivos justificativos y anexos.</p> <p>3.- Informe jurídico sobre el manejo del sistema Yupak, de un funcionario que no es debidamente autorizado a manipular el sistema.</p> <p>4.- Avances del cierre de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de años anteriores.</p> <p>5.- Copia del Presupuesto 2023 aprobado, el POA y el PAC.</p>	Con Memorando Nro. EMAPAAC EP-GG-2023-0230-M, entrega la información
Oficio No. GADIPMC - VAL - 2023 - 0058 - O,	EMAPAAC-EP	<p>Solicito la siguiente información</p> <p>1. Estados de situación financiera con corte al 31 de julio del 2023, nivel 6.</p> <p>2. Estados de situación financiera con corte al 30 de septiembre del 2023, nivel 6.</p> <p>3. Desglose de las declaraciones del SRI de los meses de julio, agosto y diciembre del 2022</p>	Con Memorando Nro. EMAPAAC EP-CPAF-2023-0936-M, entrega la información

4. Desglose de depósitos no identificados
5. Copia del último contrato colectivo firmado
6. Mayor General de las cuentas depósitos no identificados de julio a septiembre del 2023.
7. Mayor General individual de los aportes al IESS personal y patronal.
8. Mayor General de los gastos corrientes y de inversión.
9. Mayor General del Banco Central - Praguas
10. Mayor General del Banco Nacional de Fomento
11. Mayor General del Banco Transitorio
12. Mayor General del Banco del Pacífico
13. Mayor General prepagos por arrendamiento de vehículos
14. Indique hasta que mes está cargada la información financiera en el Ministerio de Finanzas. (...).

Oficio Nro.
GADIPMC-VAL-
2023-0061-0

EMAPAAC-EP

Solicito la siguiente información

1. Informe técnico financiero de la recaudación y gastos ejecutados, por concepto de tasas por el servicio de alcantarillado de la ciudad de Cayambe, hasta la presente fecha.
2. Informe técnico financiero que justifique los gastos de los dineros entregados por el GADIPMC a la EMAPAAC-EP, en el presupuesto 2022.
3. Se anexe los informes jurídico, financiero, técnico que motive la negociación del Quinto Contrato Colectivo entre la EMAPAAC-EP y el Comité de Empresa de los trabajadores de la misma.
4. Acta de la sesión del Directorio de la EMAPAAC-EP del cual consta la aprobación para la firma del Quinto Contrato Colectivo entre la EMAPAAC-EP y el Comité de Empresa de los trabajadores de la misma.

Con Memorando Nro. EMAPAAC EP-CPAF-2023-0980-M, entrega la información parcial.

		<p>5. Dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas, con los cuadros valorativos aprobados.</p> <p>6. Certificación presupuestaria del pago realizado del retroactivo, de acuerdo al Quinto Contrato Colectivo y los pagos realizados.</p> <p>7. Valor total a pagar por del Quinto Contrato Colectivo, de los años 2020,2021,2022 y 2023</p> <p>8. Informe del proceso de coactivos, para la recuperación de cartera vencida de la EMAPAAC-EP, con el monto recuperado y el número de acciones coactivas ejecutadas, hasta la presente fecha.</p>	
Oficio Nro. GADIPMC-VAL- 2023-0064-O	EMAPAAC-EP	<p>Solicito la siguiente información</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- POA de cada Jefatura 2.- Distributivo de sueldos del personal de la EMAPAAC.-EP, detallado por jefaturas y regímenes, en la que debe constar, funciones que desempeña, cargo, remuneración mensual y anual. 3.- Al tratarse de ingresos y gastos solicito las partidas presupuestarias detalladas y desglosadas. 	Entrega la información detallada las partidas presupuestarias, y la proforma presupuestaria.
Oficio Nro. GADIPMC-VAL- 2023-0043-O	EMAPAAC-EP	<p>Solicito la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estados financieros con corte al 31 de agosto del 2023, con sus respectivos justificativos y anexos. 2. Comprobantes de ajustes al 31 de agosto del 2023, con sus respectivos justificativos y anexos. 3. Informe jurídico sobre el manejo del sistema Yupak, de un funcionario que no es debidamente autorizado a manipular el sistema. 4. Avances del cierre de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de años anteriores. 5. Copia del Presupuesto 2023 aprobado, el POA y el PAC. 	Entrega la información parcial

Oficio Nro. GADIPMC-VAL- 2023-0048-0	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Toda la información recabada de la EMAPAAC-EP, he procedido con la revisión respectiva, finalmente se ha enviado a la Contraloría General del Estado, solicitando se promueva las acciones necesarias, toda vez que la ciudadanía Cayambeña requiere conocer la administración de los recursos económicos de la Empresa.	Mediante Oficio No. 2052-DNPyEI-AGPSyEI-2023AI responde, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Autónomos Descentralizados manifiesta: (...) incluirá el análisis de los aspectos señalados en el oficio que contesto, en una acción de control que efectúe en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo Cayambe EMAPAAC-EP.
Memorando Nro. GADIPMC-VAL- 2023-0239-M	Procurador Síndico	Solicito un informe técnico-jurídico, sobre el registro de inclusión de nuevos/as socios/as, que conforman la Asociación de Vendedores Mercado Dominical "Cayambe", reconocido mediante acuerdo ministerial No. 00412 de fecha 9 de enero del 2002, aprobado en Asamblea General de Socios realizada el 8 de febrero del 2022, conforme lo establece las normas y procedimiento parlamentario, estatutos y disposiciones anexas al Oficio No. 041-PS-JMOS-GADIPMC-MIES.	Con Memorando Nro. GADIPMC-PS-2023-1312-M, manifiesta que el proceso esta para devolución en razón de los conflictos internos que mantiene la organización se adjunta la impugnación de registro.
Memorando Nro. GADIPMC-VAL- 2023-0249-M	Directora Financiera (E)	Solcito un informe financiero de valores recaudado durante los últimos 8 años, por contrato de arrendamiento de los locales, bodegas y baterías sanitarias del Mercado Diario Cayambe, con sus respectivos giros y demás detalles.	Con Memorando Nro. GADIPMC-TS-DF-2023-0283-M, entrega la información, mismos que se encuentra en proceso.
Memorando Nro. GADIPMC-VAL- 2023-0186-M		Listado de personal de acuerdo a las consideraciones solicitadas. Resolución Administrativa Nro. 0025-2020-DA-GADIPMC-Periodo-2019-2023. Descriptivos de perfil de los puestos que conforman el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del GADIPMC.	Con Memorando Nro. GADIPMC-VAL-2023-0186-M se insiste la entrega de la información y con Memorando Nro. GADIPMC-DATH-2023-0569-M, entrega la información.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE

Memorando Nro. Alcalde GADIPMC-VAL- 2023-0178-M		Solicito el valor de la asignación económico que el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe otorga a la Unidad Ejecutora para la Protección de Derechos, Consejo de Protección Integral de Derechos y Junta Cantonal de Protección de Derechos Cayambe, el porcentaje y la asignación que cada uno recibe.	Sin respuesta
Oficio Nro. GADIPMC-VAL- 2023-0053-0	UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL CAYAMBE	Solicito el informe de evaluación de las observaciones áulicas de todo el personal docente, con los parámetros con los cuales fueron evaluados, información requerida de los dos últimos periodos académicos.	Entrega la información, se encuentra en proceso de análisis de la evaluación de los docentes.
Oficio Nro. GADIPMC-VAL- 2024-0012-0	UNIDAD EJECUTORA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS	Solicitar se me informe la relación que usted mantiene con el Dr. Alberto Masapanta Alcalde del Cantón Cayambe, ya sea cónyuge, conviviente en unión de hecho, o parentesco comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con sus respectivos documentos de respaldo.	Responde que no tengo parentesco alguno ni unión de hecho con el Señor Alcalde Doctor Segundo Alberto Masapanta Cobacango.



GOBIERNO AUTÓNOMO DES
INTERCULTURAL Y P
DEL MUNICIPI

